



**АВТО ЗАМЫН БОДЛОГЫН  
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР**

# ***АВТО ЗАМЫН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА***

## АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ 2018 ОНД ТӨЛӨВЛӨСӨН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ НИЙТ **657.83** ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

Нийт **16** төслийн **1399.13 км** авто замын  
барилгын ажил,  
Нийт **4** төслийн **501.5 у/м** төмөрбетон гүүрийн  
барилгын ажил


Улсын чанартай  
**15231.3** км  
авто замын засвар  
арчлалт

Улсын төсөв **69.3**  
тэрбум төгрөг

Гадаадын зээл, тусламж  
- БНХАУ-ын хөнгөлөлтэй  
зээл **494.77** тэрбум төгрөг  
- АХБ-ны хөнгөлөлттэй  
зээл **73.76** тэрбум төгрөг

Авто замын засвар,  
арчлалтад **20.0** тэрбум  
төгрөг

# АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ 2018 ОНД УЛСЫН ТӨСӨВ, ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖ, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИХ ТОМООХОН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

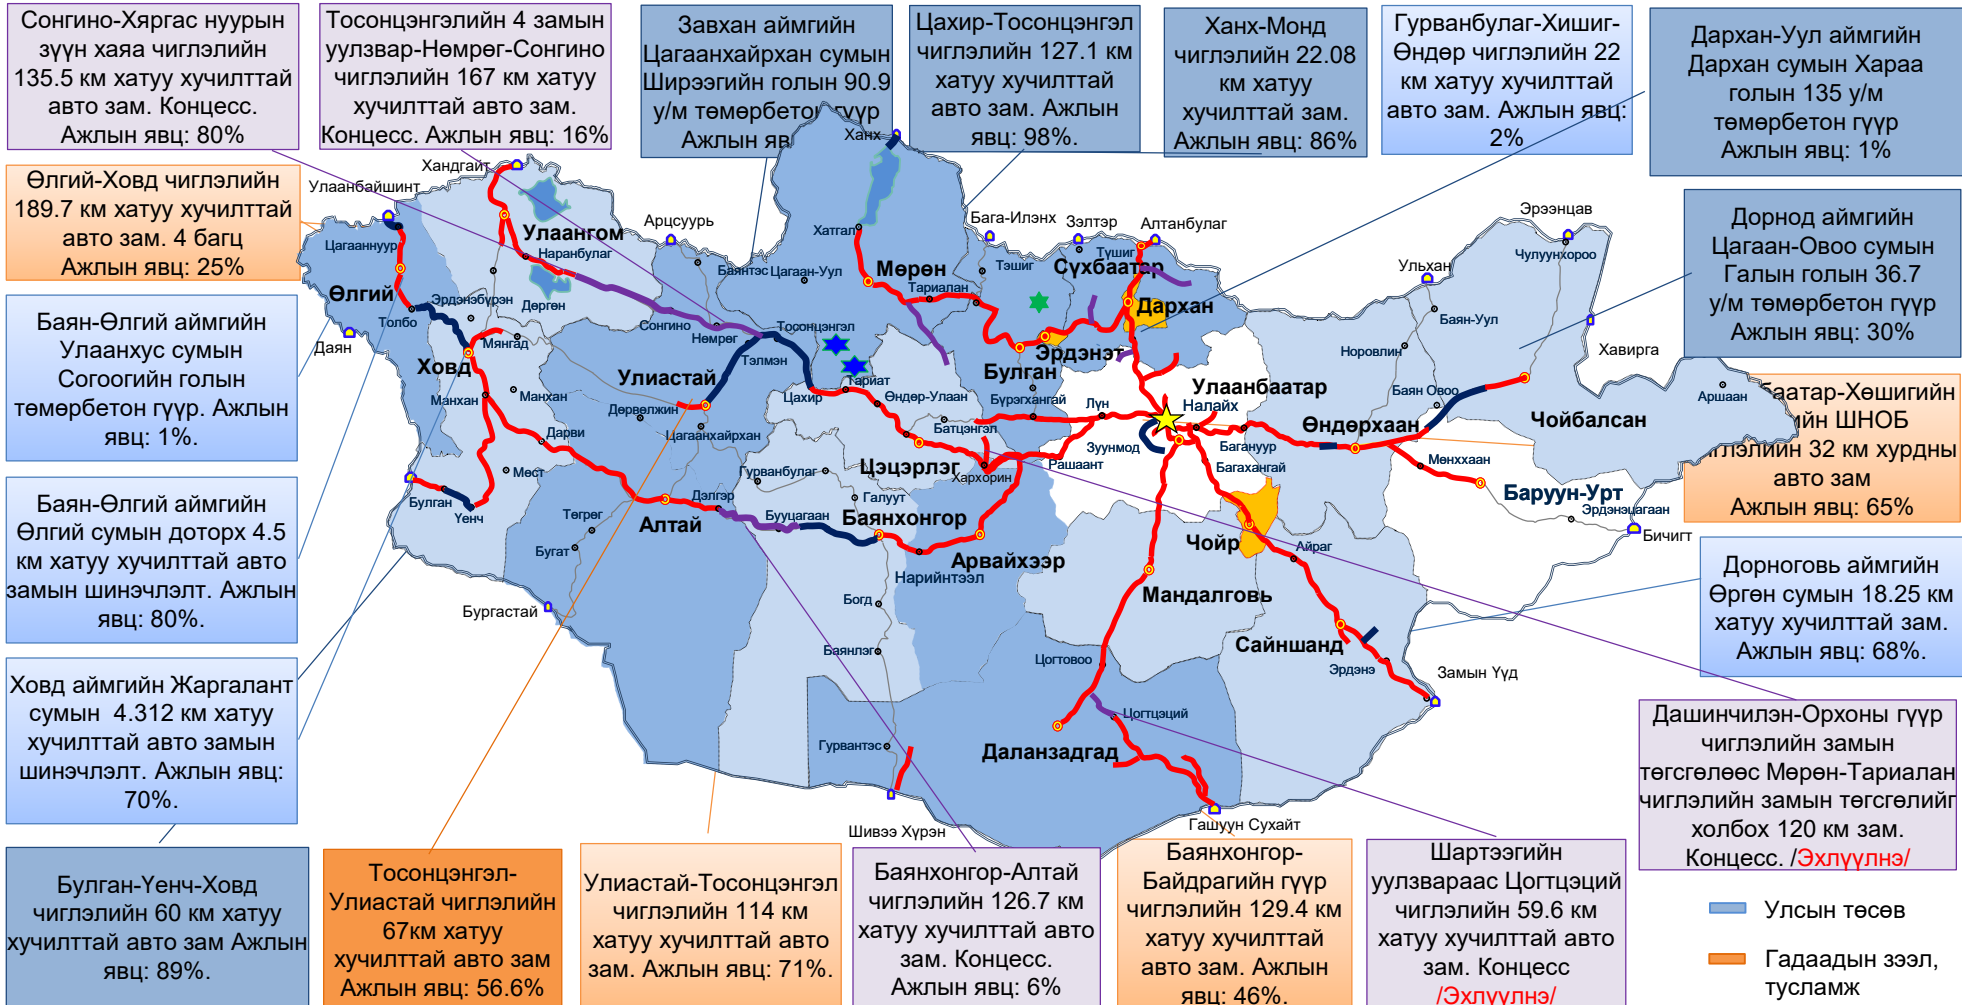

- Улсын төсөв
- Гадаадын зээл, тусламж
- Концессын гэрээ

- Улсын чанартай хатуу хучилттай авто зам – **6380.6 км**
- Баригдаж буй авто зам – **1403.96 км 17 төсөл**
- Хучилтгүй авто зам – **5488 км**
- ★ Баригдаж буй гүүр – **639.6 у/м**, 1 ш хөвдөг гүүр, 3 төсөл

2018 онд нийт **18** чиглэлийн **1399.13 км** авто зам, **4** байршилд **501.5 у/м** төмөрбетон болон хөвдөг гүүрийг барихаар төлөвлөн ажиллаж байна. Үүнээс **2** чиглэлийн **179.6 км** авто замын барилга, их засварын ажлыг шинээр эхлүүлнэ.

# 2018 ОНД ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ АШИГЛАЛТАД ОРОХ ТӨСЛҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гэрээний дагуу ашиглалтад оруулах хугацаа	Гүйцэтгэгчийн нэр	Барилга угсралтын ажлын хувь
<b>1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй төсөл, арга хэмжээнүүд</b>				
1	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127 км хатуу хучилттай авто зам	2018.10.30	"Хурдны зам" ХХК	98%
2	Ханх-Монд чиглэлийн 22.08 км хатуу хучилттай зам	2018.10.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	85%
3	Ховдын Булган-Үенч чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам	2018.10.30	"Жиансу Жунжиан Жианшин" ХХК	89%
4	Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын төвийн 4.5 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт	2018.10.30	"Жол" ХХК	80%
5	Ховд аймгийн Жаргалант сумын төвийн 4.312 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт	2018.10.30	"Түмдэлгэрэх" ХХК	70%
6	Дорнод аймгийн Цагаановоо сумын Галын голын 36.7 у/м төмөрбетон гүүр	2018.10.30	"ЗМЗ" ХХК	30%
<b>3. Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй төсөл, арга хэмжээнүүд</b>				
7	Хашаатын даваа – Шурагийн гүүр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам	2018.08.31	"Чайна Хуаши Энтерпрайзис Лимитед" ХХК	73%
8	Шурагийн гүүр - Ховд чиглэлийн 53.9 км хатуу хучилттай авто зам	2018.08.31	"Эйч Кэ Би Интернэйшнл Холдинг" ХХК	85%
9	Толбо сум – Хашаатын даваа чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам	2018.08.31	"Чайна Хуаши Энтерпрайзис Лимитед" ХХК	35%
10	Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто зам	2017.11.01	"Шинжиан Бэйшин" ХХК	71%
11	Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай авто зам	2017.11.01	"Шанхай констракшн групп" ХХК	46%
<b>4. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, концессын гэрээгээр баригдаж буй төсөл, арга хэмжээнүүд</b>				
12	Сонгино-Хяргас нуурийн зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай авто зам	2018	"Эн Си Эф" ХХК	80%
<b>2018 онд нийт 11 чиглэлийн 760.68 км авто замын барилга, их засварын ажил, 1 хэсэгт 36.7 у/м төмөрбетон гүүр ашиглалтад оруулна.</b>				

# АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ 2018-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2018-2020 он

Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант, Шинэ-Идэр чиглэлийн 95 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2020 онд эхлүүлнэ.

Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 32.4 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2019-2020 он

Хатгал-Ханх чиглэлийн 179.7 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2020 онд эхлүүлнэ.

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумаас Бага-Илэнх боомт хүртэлх 136 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2020 онд эхлүүлнэ.

Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн огцом эргэлтийн 4.4 км замын трассыг өөрчлөх авто зам. Хугацаа: 2018 он

Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт чиглэлийн авто замаас Эрэнцав боомт хүртэлх 160 км авто зам. Хугацаа: 2020 онд эхлүүлнэ.

Ховд аймгийн Дөргөн сумын Чоно харайхын голын 37.68 у/м төмөрбетон гүүр. Хугацаа: 2018-2019 он

Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын Ширээгийн голын 90.9 у/м төмөрбетон гүүр. Хугацаа: 2019 он

Алтай-Улиастай чиглэлийн 138 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2018-2020 он

Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн авто замыг Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замтай холбох 112.7 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2019-2020 он

Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн 130.6 км хатуу хучилттай зам. Уг замын Орхоны голын 220 у/м гүүр. Хугацаа: 2018-2020

Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 56 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2020 онд эхлүүлнэ.

Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 302.7 км хатуу хучилттай зам. Хугацаа: 2016-2020

Булган аймгийн Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг чиглэлийн 133.7 км авто зам. 2020 онд эхлүүлнэ.

Хялганат-Хангал-Эрдэнэт чиглэлийн 52.57 км хатуу хучилттай зам. Хугацаа: 2018-2019

Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн авто замаас Зүүнбаян уул чиглэлийн 16 км авто зам. Хугацаа: 2019 он

Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 45 км хатуу хучилттай зам. Хугацаа: 2018-2019 он

Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт чиглэлийн 125.5 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2019-2020 он

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Баянхошуу боомт хүртэлх 323 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2020 онд эхлүүлнэ.

Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2018-2020 он.

Дархан-Шарын гол чиглэлийн 47.97 км хатуу хучилттай авто зам. Хугацаа: 2020 онд эхлүүлнэ.



- █ 2017 онд баригдах авто зам - 1403.96 км, 17 төсөл
- █ 2018 онд барьж эхлүүлэх авто зам - 1108.27 км, 8 төсөл
- █ 2019 онд барьж эхлүүлэх авто зам - 286.6 км, 4 төсөл
- █ 2020 онд барьж эхлүүлэх авто зам - 1131.37 км, 8 төсөл

★ 2018-2019 онд баригдах гүүр – 348.58 у/м , 3 төсөл

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх нийт 20 чиглэлийн 2526.24 км авто зам, 3 байршилд 348.58 у/м төмөрбетон гүүрийг барихаар төлөвлөн ажиллаж байна.

# КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭГЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА БОЛОН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА


- 1.** Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам. Гэрээ байгуулсан. Эзэмшигч: "Лунзьянь Роуд энд Бридж" ХХК Ажлын явц: 100%.
- 2.** Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам Гэрээ байгуулсан. Эзэмшигч: "Лунзьянь Роуд энд Бридж" ХХК Ажлын явц: 100%.
- 3.** Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл тосгон дахь гүүрийн барилгын ажил төсөл /Хараа голын 72.85 у/м гүүр/ Эзэмшигч: "ЗМЗ" ХХК Ажлын явц: 100%.
- 4.** Мандал сум-Зүүн хараа чиглэлийн 15.8 км авто зам Гүйцэтгэгч: "Замын битум" ХХК Ажлын явц: 100%.
- 5.** Яармагийн товчооноос Жаргалантын ам хүртэлх 3.4 км хатуу хучилттай авто зам. Гүйцэтгэгч: "Наранбулаг хан" ХХК Ажлын явц: 100%.
- 6.** Дархан-Эрдэнэтийн авто замаас Амарбаясгалантын хийд чиглэлийн 63 км Замын 2, 3-р багцын 22.2 км зам Ажлын явц: 87%



- 11.** Сонгино-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай авто зам. Гэрээ байгуулаагүй. Эзэмшигч: "Хос мөнгөн зам" ХХК Ажлын явц: 65%
- 12.** Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай авто зам. Гэрээ хүчин төгөлдөр болоогүй.
- 13.** Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замын төгсгөлөөс Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км. Барилгын ажил эхлээгүй.
- 14.** Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай авто зам Гэрээ байгуулсан. Эзэмшигч: "Эрчим хүчний барилга угсралтын трест" ХХК. Шүүхийн маргааны улмаас ажлыг түр зогсоосон тул шүүхийн шийдвэр гарсаны дараагаар холбогдох арга хэмжээг авах.
- 15.** Дархан-Сэлэнгийн авто замаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км. Гэрээ хүчин төгөлдөр болоогүй.
- 16.** Шартээгийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто зам. ЗГ-ын тогтоол албажаагүй байна.
- 17.** Дархан-Эрдэнэтийн авто замаас Амарбаясгалантын хийд чиглэлийн 63 км замын 1-р багцын 33.4 км зам. Барилгын ажил эхлээгүй.
- 7.** Дулаанханы 4-н замын уулзвар-Ерөө-Хүдэр чиглэлийн 95 км хатуу хучилттай зам Эзэмшигч: "Кью Эс Си" ХХК. Ажлын явц: 85%
- 8.** Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх 6.2 км хатуу хучилттай авто зам. Эзэмшигч: "Хансуун зам" ХХК. Ажлын явц: 80%
- 9.** Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Идэрийн голын хөвдөг гүүр. Эзэмшигч: "Урагшлах" ХХК. Ажлын явц: 70%
- 10.** Эгийн голын усан цахилгаан станцын урьдчилсан шатын дэд бүтцийн ажил. Гэрээ байгуулсан. Үүнд 72 км хатуу хучилттай авто зам. Эзэмшигч: "Чайна гэжуба групп лимитид" ХХК. Барилгын ажил эхлээгүй байна. Сэлэнгэ мөрний 321.08 у/м гүүрийн барилгын ажлын явц: 1%.

- Барилгын ажил нь дууссан болон улсын ашиглалтад орсон төслүүд - 5 чиглэлийн **282.2 км** авто зам, 1 хэсэгт **72.85 у/м** гүүр
- Барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх төслүүд - 5 чиглэлийн **385.6 км** авто зам, 1 хэсэгт хөвдөг гүүр
- Барилгын ажлыг 2017 эхлүүлж, концессын төлбөрийг 2021 оноос эхлэн төлөх төслүүд - 2 чиглэлийн **287 км** авто зам
- Хэрэгжүүлэх хугацааг хойшлуулах төслүүд - 4 чиглэлийн **285.85 км** авто зам, 1 хэсэгт **321.08 у/м** гүүр

# ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОР ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА БОЛОН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

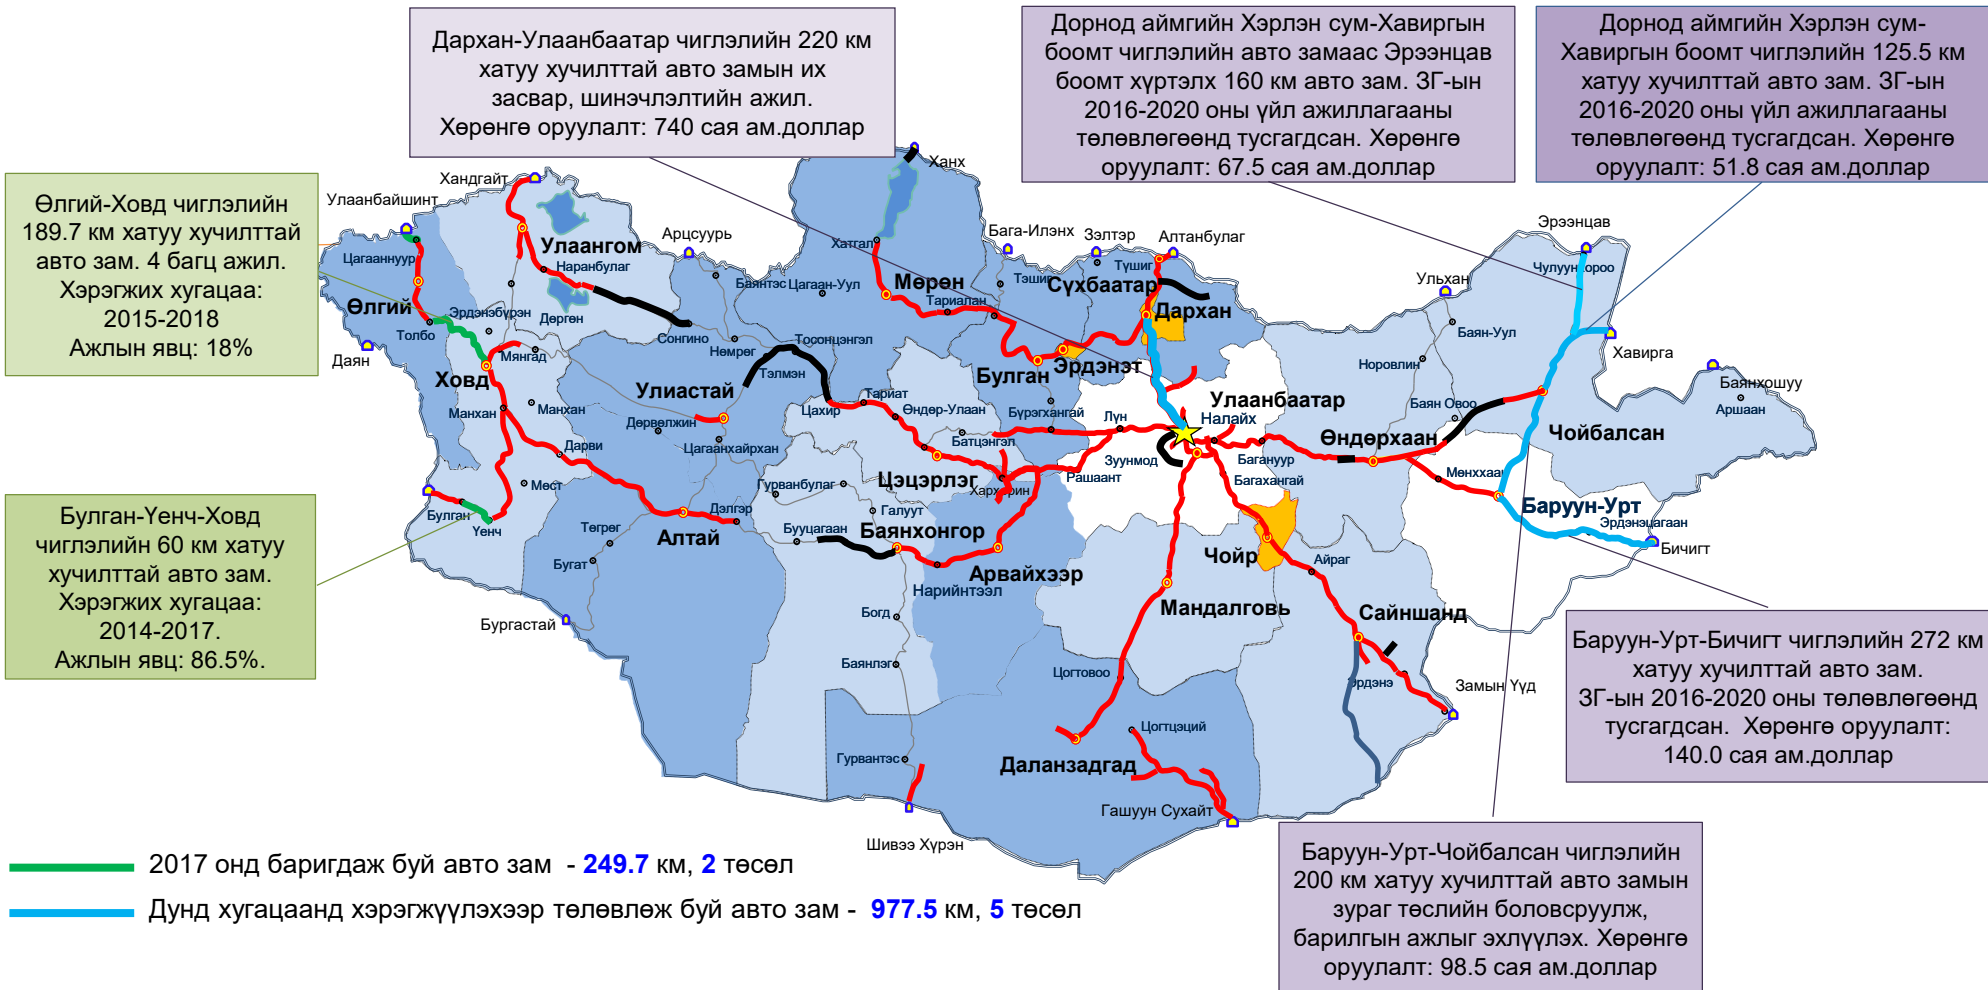

1. Эдийн засгийн **баруун бүсийн** коридорын хүрээнд: Нийт **2** төсөл, арга хэмжээний **149.7** км авто замын барилгын ажил үргэлжилж байна.
2. Эдийн засгийн **төвийн бүсийн** коридорын хүрээнд: Нийт **1** төсөл, арга хэмжээний **220** км авто зам. Үүнд **740** сая ам.доллар хөрөнгө
3. Эдийн засгийн **зүүн бүсийн** коридорын хүрээнд: Нийт **4** төсөл, арга хэмжээний **757.5** км авто замд **357.8** сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт, нийт **1,097.8** сая ам.доллар шаардагдахаар байна.

# ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖИХ ХӨРӨНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР ТОДОРХОЙГҮЙ БАЙГАА ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)				Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэрэгжүүлэгч байгууллага	
					2017	2018	2019	2020		Хамтрагч	Оролцогч
<b>2.107. Олон улс, хот хоорондын болон орон нутгийн чанартай авто замын сүлжээн дэх хатуу хучилттай авто замын сүлжээг өргөтгөж, бүх аймгийн төвийг нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбож дуусгах, Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн хэсгийг үргэлжлүүлэх ажлын хүрээнд:</b>											
<b>2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ</b>											
1	Байдрагийн гүүр-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай авто зам	2017-2019	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	152,320.0	30,464.0	76,160.0	45,969.0	-	Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	ҮХГ
2	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67км хатуу хучилттай авто зам	2016-2017	Гадаадын эх үүсвэр	28,980.0	24,840.0	4,140.0			2017 онд барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	
3	Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 302.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн дуусгах	2017-2020	Улсын төсөв, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	143,086.0	14,308.6	28,617.2	42,925.8	57,234.4	Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	Өмнөговь аймгийн ЗДТГ	-
<b>Нийт дүн</b>				<b>324,246.0</b>	<b>69,612.6</b>	<b>108,917.2</b>	<b>88,894.8</b>	<b>57,234.4</b>			
<b>2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ</b>											
4	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн огцом эргэлтийн трасс өөрчлөн барих 4.4 км хатуу хучилттай авто зам	2018	Улсын төсөв	3,300.0		3,300.0			Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	-
5	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 45 км хатуу хучилттай замыг барих	2018-2019	Улсын төсөв	14,600.0		5,840.0	8,760.0		Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	-
6	Хялганат-Хангал-Эрдэнэт чиглэлийн 52.57 км хатуу хучилттай авто зам	2018-2019	Улсын төсөв	32,500.0		9,750.0	22,750.0		Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	-
7	Архангай аймгийн Өгийнуур сум Өгийн доод Орхон голын 220 у/м төмөрбетон гүүр	2018-2019	Улсын төсөв	9,450.0		2,835.0	6,615.0		Гүүрийн барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	-
8	Чоно харайх голын 37.68 у/м төмөр бетон гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2018-2019	Улсын төсөв	1,400.0		1,260.0	140.0		Гүүрийн барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	-
9	Өгийнуур-Батцэнгэл- Ихтамир чиглэлийн 130.6 км хатуу хучилттай авто зам	2018-2020	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	95,300.0		19,060.0	47,650.0	28,590.0	Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	ҮХГ
10	Алтай-Улиастай чиглэлийн 138 км хатуу хучилттай авто зам	2018-2020	Гадаад эх үүсвэр,Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	99,457.0		9,945.7	49,728.5	39,782.8	Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	ҮХГ
11	Ховд-Улаангом чиглэлийн 163.3 км хатуу хучилттай авто зам	2018-2020	Гадаад эх үүсвэр,Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	153,740.0		15,374.0	92,224.0	46,122.0	Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	ҮХГ
12	Баруун Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км авто зам	2018-2020	Гадаад эх үүсвэр,Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	220,000.0		44,000.0	110,000.0	66,000.0	Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	ҮХГ
13	Тавантолгой, Сайншанд чиглэлийн бетонон хучилттай, хүнд даацын 500 км авто зам барих ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, хөрөнгө оруулалтын нөхцөлийн тохиролцоо, судалгаа хийх	2018-2020	-	-	-	ТЭЗҮ-ийг боловсруулах	Хөрөнгө оруулалтын тохиролцоо, судалгааны ажлыг хийх	Хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх	ТЭЗҮ-ийг боловсруулах, судалгаа хийх, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх	СЯ	-
<b>Нийт дүн</b>				<b>629,747.0</b>		<b>111,364.7</b>	<b>337,867.5</b>	<b>180,494.8</b>			



# ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖИХ ХӨРӨНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР ТОДОРХОЙГҮЙ БАЙГАА ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)				Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэрэгжүүлэгч байгууллага	
					2017	2018	2019	2020		Хамтрагч	Оролцогч
<b>2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ</b>											
13	Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн авто замаас Зүүнбаян уулын чиглэлийн 16 км авто зам	2019	Улсын төсөв	10,000.0			10,000.0	-	Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	-
14	Завханы Цагаанхайрханы Ширээгийн голын 90.9 у/м төмөр бетон гүүр	2019	Улсын төсөв	3,780.0			3,780.0	-	Гүүрийн барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	-
15	Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 32.4 км хатуу хучилттай авто зам	2019-2020	Улсын төсөв	20,400.0			8,160.0	12,240.0	Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	-
16	Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замын төгсгөлөөс Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 112.7 км хатуу хучилттай зам	2019-2020	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	133,700.0			26,740.0	160,960.0	Зам барилгын ажлыг дуусгасан байна.	СЯ	ҮХГ
17	Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт чиглэлийн 125.5 км хатуу хучилттай авто зам	2019-2020	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	68,460.0			22,820.0	45,640.0	Зам барилгын ажлын 60 хувийг хийж гүйцэтгэсэн байна.	СЯ	ҮХГ
<b>Нийт дүн</b>				<b>236,340.0</b>			<b>71,500.0</b>	<b>218,840.0</b>			
<b>2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ</b>											
18	Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 56 км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх	2019-2020	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	14,560.0			7,280.0	7,280.0	Зураг төслийг 2019 онд боловсруулж, 2020 онд зам барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.	СЯ	ҮХГ
19	Хатгал-Ханх чиглэлийн 179.7 км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх	2019-2020	Улсын төсөв, гадаад эх үүсвэр	11,123.6			683.6	10,440.0	Зураг төслийг 2019 онд боловсруулж, 2020 онд зам барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.	СЯ	-
20	Булган-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг чиглэлийн 133.7 км хатуу хучилттай авто зам	2020	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	10,320.0				10,320.0	Зам барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.	СЯ	ҮХГ
21	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Баянхошуу боомт чиглэлийн 323 км хатуу хучилттай авто зам	2020	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	22,710.0				22,710.0	Зам барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.	СЯ	ҮХГ
22	Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт чиглэлийн авто замаас Эрэнцав боомт хүртэлх 160 км хатуу хучилттай авто зам	2020	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	11,230.0				11,230.0	Зам барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.	СЯ	ҮХГ
23	Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумаас Бага-Илэнх боомт хүртэлх 136 км хатуу хучилттай авто зам	2020	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	13,200.0				10,320.0	Зам барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.	СЯ	ҮХГ
24	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант, Шинэ-Идэр чиглэлийн 95 км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийн боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх	2020	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	14,010.0			4,670.0	9,340.0	Зураг төслийг 2019 онд боловсруулж, 2020 онд зам барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.	СЯ	ҮХГ
25	Дархан-Шарын гол чиглэлийн 47.97 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх	2020	Улсын төсөв	5,640.0				5,640.0	Зам барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.	СЯ	-
<b>Нийт дүн</b>				<b>102,793.6</b>			<b>12,633.6</b>	<b>87,280.0</b>			
<b>2017-2020 онд зам барилгын ажилд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын нийт дүн</b>				<b>1,264,286.6</b>	<b>73,612.6</b>	<b>220,281.9</b>	<b>510,895.9</b>	<b>543,849.2</b>			

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН  
АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖИХ ХӨРӨНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР  
ТОДОРХОЙГҮЙ БАЙГАА ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)				Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэрэгжүүлэгч байгууллага	
					2017	2018	2019	2020		Хамтрагч	Оролцогч
<b>2.121. Авто замын засвар, арчлалтын хугацааг уртасгах, чанарыг сайжруулах, хөрөнгийн эх үүсвэрийг үе шаттай нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд:</b>											
1	Олон улсын болон улсын чанартай авто замын сүлжээний бэлэн байдлыг жилийн туршид хангах арчлалт, засварын ажлыг норм, нормативын дагуу хийж гүйцэтгэх	2016-2020	Улсын төсөв	189,810.0	39,310.0	48,000.0	50,000.0	52,500.0	Арчлалт, засварын ажлыг норм, нормативын дагуу хийж гүйцэтгэсэн байна.	СЯ	-
2	Улаанбаатар-Дархан-Алтанбулаг, Улаанбаатар-Арвайхээр, Дархан-Эрдэнэт, Улаанбаатар-Чингис, Налайх-Чингис чиглэлийн нийт 504 км авто замд их засвар шинэчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх	2016-2020	Улсын төсөв	226,800.0	56,700.0	56,700.0	56,700.0	56,700.0	2017-2020 онд жил бүр 126 км авто замд их засвар, шинэчлэлтийн ажил гүйцэтгэсэн байна.	СЯ	-
3	Дархан-Эрдэнэт, Улаанбаатар-Арвайхээр, Улаанбаатар-Чингис, Налайх-Чойр, Хархорин-Цэцэрлэг, Улаангом-Хандгайт, Өлгий-Улаан байшинт чиглэлийн 725 км авто замд ээлжит засварын ажлыг гүйцэтгэнэ.	2016-2020	Улсын төсөв	145,000.0	36,250.0	36,250.0	36,250.0	36,250.0	2017-2020 онд жил бүр 81 км авто замд ээлжит засварын ажил гүйцэтгэсэн байна.	СЯ	-
4	Чигэстэй, Онги, Түргэн, Цалгар, Усан хоолой, Цагаан сүм, Тэс, Хэрлэн, Буянт, Хуурай хөндий, Хараагийн нийт 1128.5 у/м төмөр бетон гүүрэнд их засвар шинэчлэлтийн ажил хийнэ.	2016-2020	Улсын төсөв	16,400.0	4,100.0	4,100.0	4,100.0	4,100.0	2017-2020 онд жил бүр 282.1 у/м төмөрбетон гүүрийн их засварын ажил гүйцэтгэсэн байна.	СЯ	-
<b>Нийт дүн</b>				<b>578,010.0</b>	<b>136,360.0</b>	<b>145,050</b>	<b>147,050.0</b>	<b>149,550.0</b>			
<b>2017-2020 онд шаардлагатай авто замын барилга болон засварын ажлын хөрөнгө оруулалтын нийт дүн</b>				<b>1,605,956.6</b>	<b>205,972.6</b>	<b>365,331</b>	<b>586,445.9</b>	<b>474,559.2</b>			

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД  
БАЯРЛАЛАА.
